
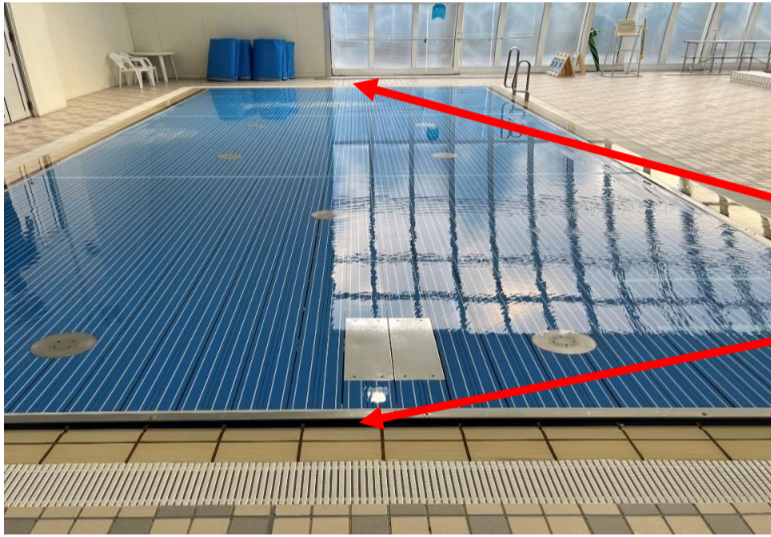
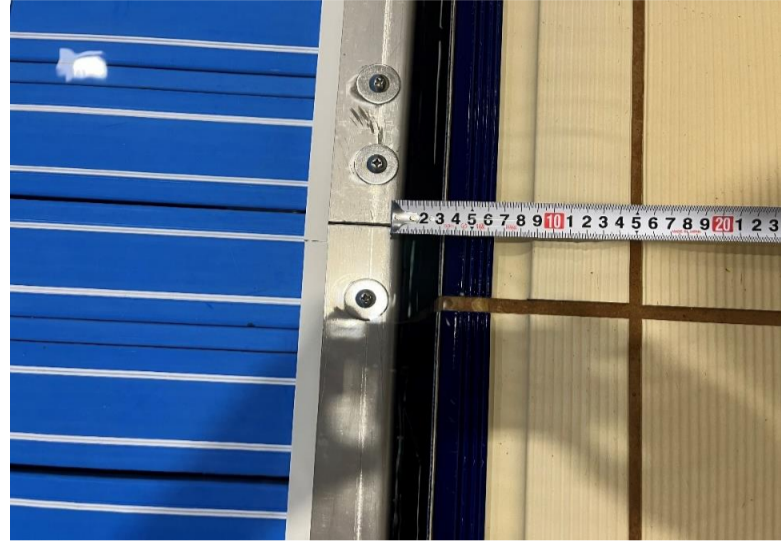


<多目的プール現状報告>

①壁面と床材の間に隙間(東側20mm・西側30mm)があります。危険なため修繕が必要です。

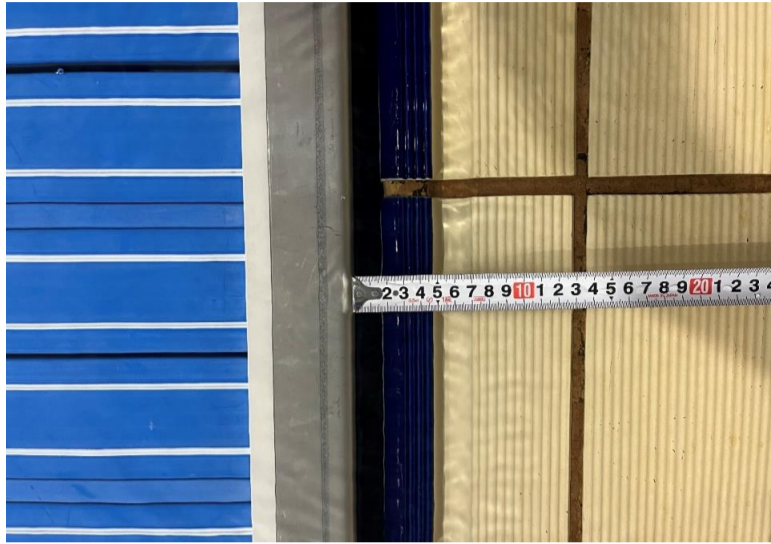

東側

西側

②壁面(4方向)タイルの合計111枚に浮きがあります。剥がれる可能性があるため、張替えが必要です。



③床材を支える部品が破損しています。部品は4カ所にあり、全て交換が必要です。

